


РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД ОБНИНСК» В 2018 ГОДУ

МП «Горэлектросети» выступило в качестве заказчика при выполнении следующих работ:



1.ВЫПОЛНЕННЫ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УЛ.ПИРОГОВА



- Установлено 14 ж/б опор СКЦ11-2,5,
- Смонтирован провод СИП4 4х25 мм2 длиной 690 м,
- Установлено 16 светильников Галад Победа 150 Вт.
- Демонтировано 10 ж/б опор, 10 светильников ЖКУ.

- Стоимость ПИР – 62 645 руб.
- Стоимость СМР – 835 000 руб.

2.ОСВЕЩЕНИЕ ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКИ ОТ УЛ.ТРУДА И ПРОЕЗДА ОТ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ЦМСЧ №8 ДО ПР.ЛЕНИНА



- Установлено 13 опор СВ-95, 18 опор СКЦ11-2,5,
- Смонтирован провод СИП4 4х25 мм² длиной 980 м,
- Установлено 13 светодиодных светильников мощностью 100Вт и 23 светодиодных светильника мощностью 150 Вт.
- Демонтировано 15 ж/б опор, 24 светильников РКУ.
- Стоимость ПИР – 129 764 руб.
- Стоимость СМР– 1 358 624 руб.



**3.ВЫПОЛНЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНОЙ
ДОРОЖКИ ОТ УЛ.ЛЮБОГО, 13 ДО УЛ.ЗАВОДСКОЙ И ОСВЕЩЕНИЕ ПРОЕЗДА ОТ
Ж/Д №13 ПО УЛ.ЗАВОДСКОЙ ДО САМСОНОВСКОГО ПРОЕЗДА**




Установлено 4 ж/б опоры СКЦ 9-2,5,
Смонтировано 112 метров провода СИП4 4х25 мм2, 4 светильника Галад Победа 100 Вт, 8 торшерных стоек ОГК-4, 8 светильников Шар LED 40 Вт, Проложено 213 метров кабеля АПвБбШп-1 4х25 мм2.

-Стоимость ПИР – 60 385 руб.
-Стоимость СМР - 581 600 руб.



4.ВЫПОЛНЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТРОТУАРОВ ВДОЛЬ ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО САДА "ЛАСТОЧКА" УЛ.ГУРЬЯНОВА 17 И ОТ УЛ.ГУРЬЯНОВА ВДОЛЬ ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №7 И РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРОЕЗДА ВДОЛЬ ТЕРРИТОРИИ ОБНИНСКОЙ СВОБОДНОЙ ШКОЛЫ ПО УЛ.ГУРЬЯНОВА, 11 И ПЕШЕХОДНОГО ТРОТУАРА ВДОЛЬ ДЕТСКОГО САДА "КАПЕЛЬКА" ПО УЛ.ГУРЬЯНОВА, 9

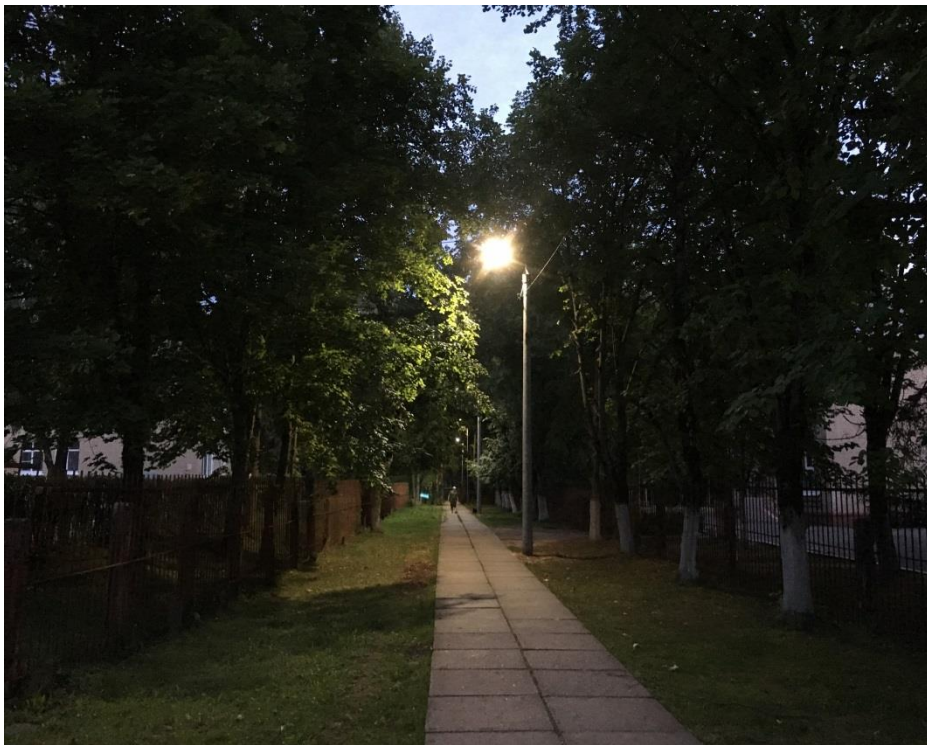

-Установлено 16 опор СКЦ 9-2,5; 16 светильников
Галад Победа 100 Вт, 475 м провода СИП4 4х25 мм2

-Стоимость ПИР – 76 489 руб.
-Стоимость СМР – 895 264 руб.



5.ВЫПОЛНЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ

- Ул.Горького, 19 , 21.
- Пр.Ленина, 119а
- Ул.Аксенова, 7
- Пр.Маркса, 4
- Ул.Гагарина, 45 и ул.Гагарина, 57 и ул.Гагарина, 46
- Освещение ул.Мигунова в районе Поликлиники №2
- Пр.Ленина, 132а.


По данным адресам установлены дополнительные светодиодные светильники для увеличения освещенности пешеходных переходов и тротуаров.

Общая стоимость СМР – 602 703 руб.





6.ВЫПОЛНЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ **УЛ.КУТУЗОВА НА УЧАСТКЕ ОТ ПИОНЕРСКОГО ПРОЕЗДА ДО** **ПЯТКИНСКОГО ПРОЕЗДА**

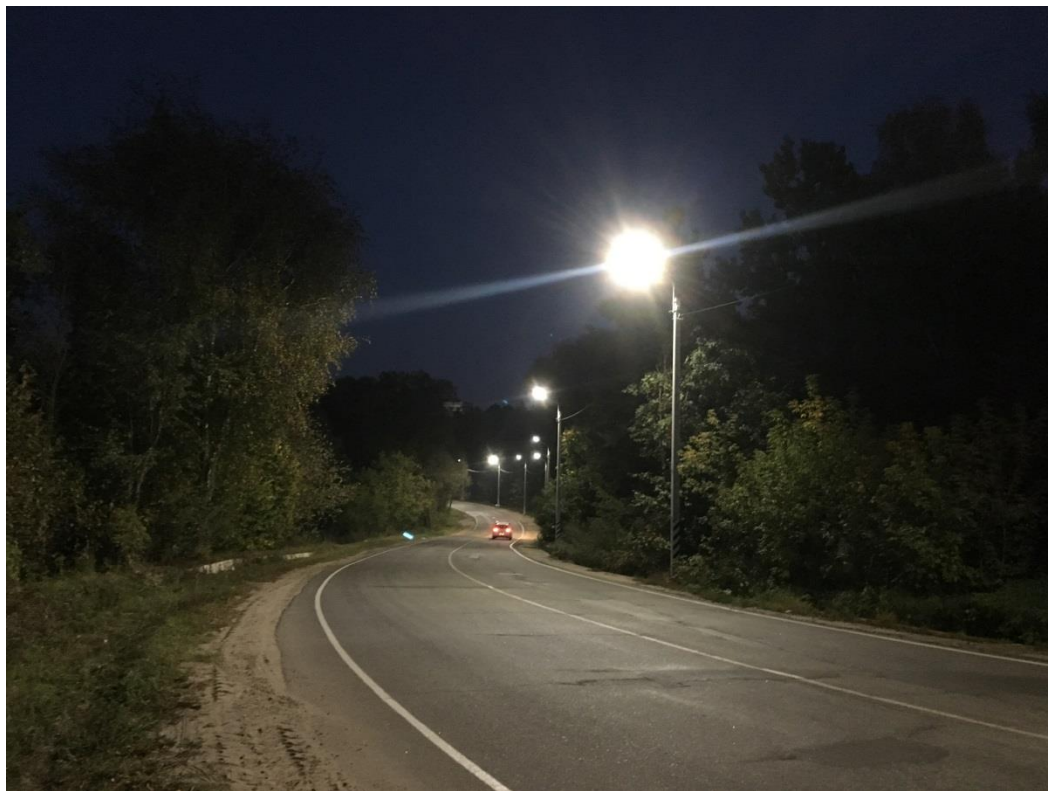

- Установлено 51 опора СВ 110,
54 светильника Галад Победа
мощностью 150 Вт,
- Проложено 1780 м провода
СИП4 4х35 мм².
- Стоимость ПИР – 99 509 руб.
- Стоимость СМР – 2 039 349
руб.

7.ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВНУТРИДВОРОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР.МАРКСА, 20

- Установлено 10 опор ОГК-4,0-02, 10 светодиодных светильников Шар 40Вт,
- Проложено 285 м кабеля АПвБШв-1 4х16 мм²
- Стоимость ПИР – 20 000 руб.
- Стоимость СМР – 481 993 руб.



8.ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА УЧАСТКЕ ОТ УЛ.КАЛУЖСКАЯ ДО ПР.МАРКСА, 100 (В РАЙОНЕ ШКОЛЫ №12)

- Установлено 6 ж/б опор СКЦ-9-2,5, 6 светильников Галад Победа 100Вт,
- Смонтировано 168 м провода СИП-4 4х25 мм²

- Стоимость ПИР – 29 070 руб.
- Стоимость СМР – 277 661 руб.



9.ВЫПОЛНЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ БЕСХОЗНОГО ТОРШЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО В РАЙОНЕ УЛ.БЕЛКИНСКАЯ, 21 И 25

- Установлено 13 светодиодных светильников Галад Шар 40Вт,
- Проложено 23 м кабеля АПвБШв-1 4х16 мм²
- Стоимость СМР – 199 229 руб.



**10.ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТОРШЕРНОГО И
ВНУТРИДВОРОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВО ДВОРАХ ПО УЛ.ЭНГЕЛЬСА,
20, 24, 28, 32**

Установлено 11 опор СКЦ9-2,5, 12 светодиодных светильников Галад Победа 100 Вт, проложено 256м провода СИП4 4х25 мм², установлено 16 торшеров и 16 светильников Галад Шар 40 Вт (светодиодных), проложено 408 м кабеля АПвБбШп-1 4х25 мм²

Общая стоимость работ – 1 373 490 руб.





11.ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ НА УЛ.ЖУКОВА

Установлено 2 опоры СКЦ11-2,5, 4 светильника Галад Победа 100 Вт




Стоимость СМР – 132 929 руб.

12.ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРОЕЗДОВ В 52 МИКРОРАЙОНЕ И ТОРШЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКИ ОКОЛО Д/С № 42

Установлено 29 ж/б опор СКЦ 9-2,5 и 854 метра провода СИП-4 4х25 мм², смонтировано 30 светодиодных светильников мощностью 100 Вт, установлено 7 торшерных стоек ОГК и 7 светодиодных торшерных светильников «Шар», мощностью 40 Вт., проложено 224 метра кабеля АВБбШв-1 4х25 мм²

Общая стоимость работ (СМР и ПИР) – 1 586 087 руб.

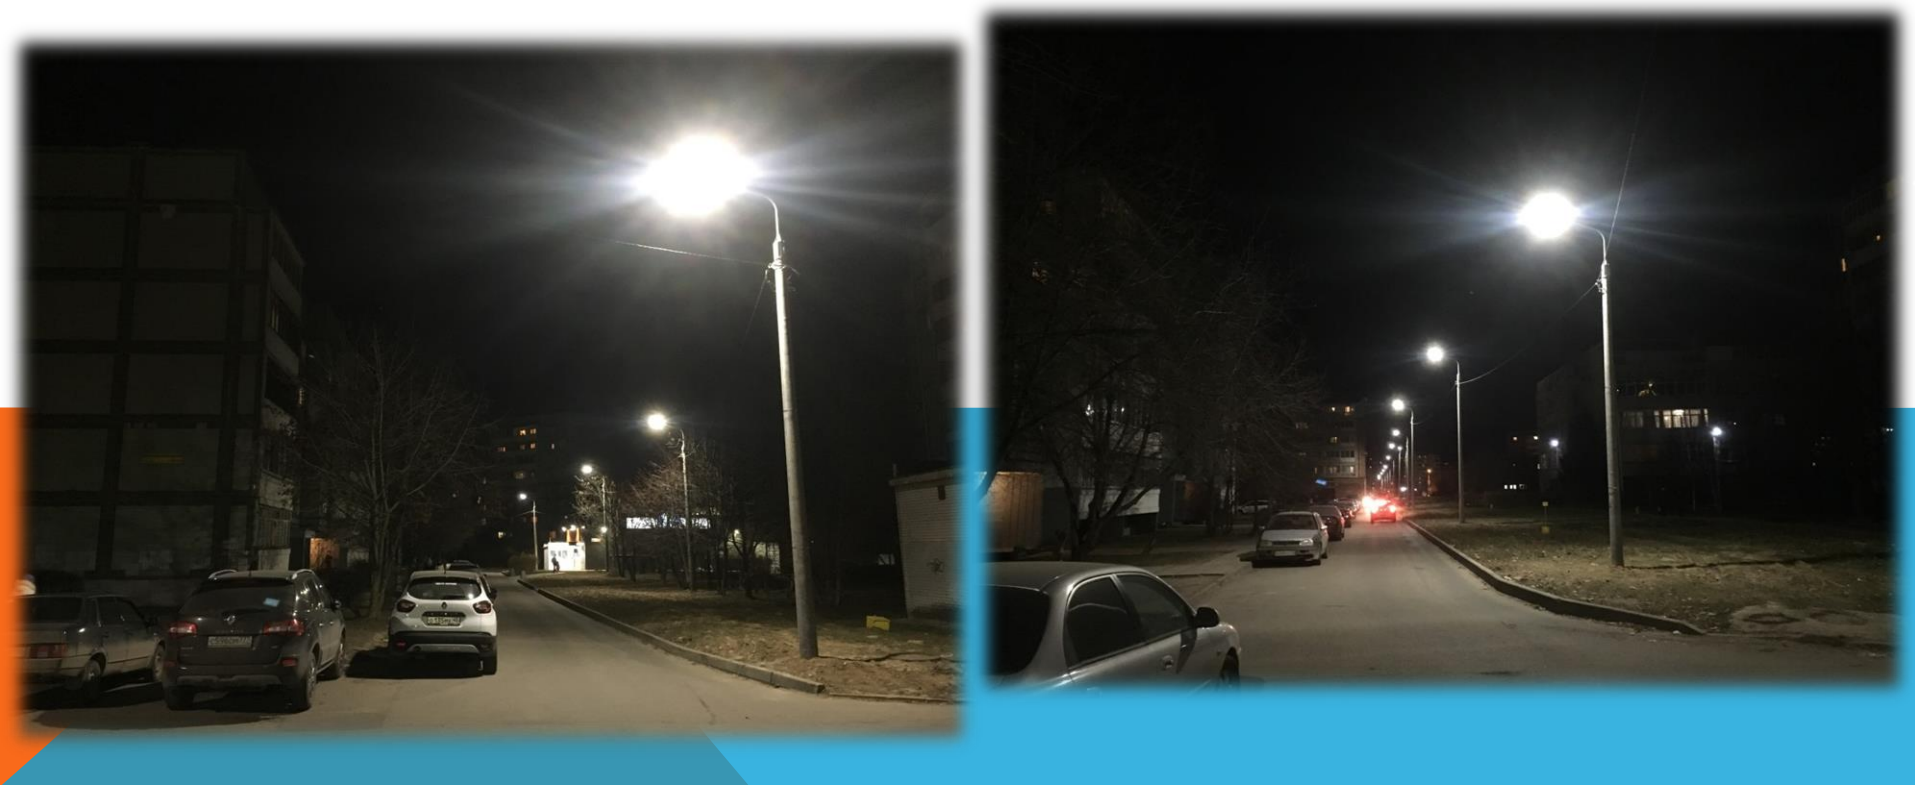



13. Выполнены работы по строительству наружного освещения тротуара от ж/д по ул.Курчатова, 38 до ул.Аксенова, 6 в микрорайоне 45 (от «Коробейников» до «Скалы»).

Установлено 8 ж/б опор СКЦ-10-2,5, смонтирован 291 м провода СИП4 4х25 мм², 9 светодиодных светильников мощностью 100 Вт, 7 торшерных стоек ОГК-4 со светильниками Шар (светодиодными) мощностью 40 Вт. Проложено 206 м кабеля АПвБбШп-1 4х25 мм²

Общая стоимость работ (СМР и ПИР) – 867 517 руб.



14. Выполнены работы по реконструкции наружного освещения в районе остановки общественного транспорта по пр.Маркса, 50 (магазин «Маргарита»).

Установлено 2 ж/б опоры СКЦ-11-2.5, 3 светильника ЖКУ16-150 и 4 светильника ЖКУ16-250. Смонтировано 200 метров провода СИП4 4x25 мм²

Общая стоимость работ (СМР и ПИР) – 201 311 руб.



15. ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ О ДОБРОВОЛЬНОМ УЧАСТИИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВНУТРИДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ОБНИНСК", УТВЕРЖДЕННОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 447-П ОТ 28.03.2016 ГОДА.

Перечень домов, планируемых для участия в программе (всего 16 домов):

Ул.Гагарина, 37, 39

Ул.Звездная, 15

Пр.Ленина, 154, 162, 182, 218, 74

Ул.Энгельса, 15, 156, 17а. 176, 19а

Ул.Курчатова, 2

Пр.Маркса, 98

Ул.Жолио-Кюри, 3

Общая стоимость работ (СМР и ПИР) – 1 580 195 руб.

Всего на строительство и реконструкцию сетей наружного освещения в 2018 году выделено 13 477 745,50 руб., израсходовано после проведения аукционов - 13 241 998 руб., в том числе:

- ТОС «32 мкр.» - 656 627 руб.(пр. Маркса, 20)
- ТОС «Мирный» - 184 608 руб. (ул. Труда)
- ТОС «45мкр.» – 816 038 руб. (тротуар от Коробейников до ул. Аксенова)
- ТОС «38-39 мкр.») – 1 320 472 руб. (ул. Энгельса)
